



## Info 5 über den Stand des Glasfaserprojekts

### Ab dem 10. Mai 2021 wird gebaut!

Alle Eigentümerinnen und Eigentümer werden in den nächsten Tagen ein Infoschreiben der ausführenden Firma bekommen. Darauf ist das detaillierte weitere Vorgehen beschrieben und die Mitarbeitenden der beauftragten Firmen auf einem Foto aufgeführt. So ist gewährleistet, dass sich die Arbeiter ausweisen können und alle sicher sein können, dass es sich nicht um unberechtigte Personen handelt.

Sobald dann die Verbindungsleitungen eingezogen sind, werden die Hausanschlüsse eingebaut. Dabei wird vorgängig durch einen Spezialisten die Situation nochmals mit den Eigentümern besprochen und schriftlich festgehalten.

Die Installationen in den Häusern wird durch eine speziell ausgebildete Fachperson erledigt. Auch diese Personen sind mit einem Ausweis ausgerüstet.


Die Reihenfolge der Ausführung ist wie folgt:

1. MAZ 003 / 2. MAZ 004 / 3. MAZ 005 / 4. MAZ 001 / 5. MAZ 006 / 6. MAZ 002

Da die Verbindung von der Moosgasse ins Aspi erst im Spätherbst gebaut werden kann, erfolgt der Bau der Glasfaser zum Aspi gegen Ende des Jahres.

Hier der gültige Ablaufplan der einzelnen MAZEN:

### FTTH Barga, Roll Out-Plan

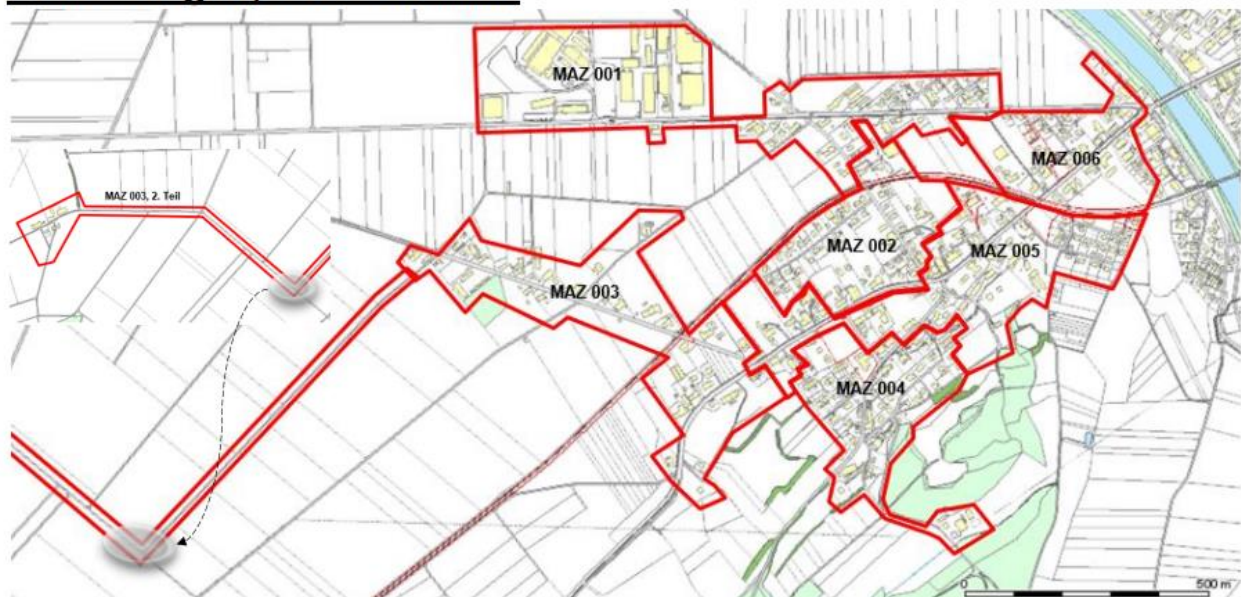

<b>MAZ 003</b>	Realisierung	Mai - Juli 2021	<b>MAZ 001</b>	Realisierung	August - September 2021
<b>MAZ 004</b>	Realisierung	Juni - September 2021	<b>MAZ 006</b>	Realisierung	September – Oktober 2021
<b>MAZ 005</b>	Realisierung	Juli - September 2021	<b>MAZ 002</b>	Realisierung	September – November 2021
			<b>MAZ 003, 2. Teil</b>	Realisierung	November - Dezember 2021
