



Info 6 über den Stand des Glasfaserprojekts

Der Kabelzug der MAZ003 läuft und bereits sind viele Gebäude mit Glasfaser erschlossen. Auch die Verbindungsleitung zwischen dem Verteilcenter Aarberg und dem Verteilraum in Bargaen sind eingebaut und werden im Moment gespleisst. (verbunden)


Ab nächster Woche wird mit den Anschlüssen in den Gebäuden begonnen. Diese Arbeiten werden durch Mitarbeiter der Firma Linder Elektro Lyss durchgeführt. Vorgängig wird mit den Eigentümern Kontakt aufgenommen und das Vorgehen besprochen. Auch diese Mitarbeiter sind mit einem Ausweis ausgestattet und müssen sich ausweisen können.

Der Kabelzug wird mit der MAZ 004 fortgesetzt und ist in der Region Niederriedstrasse bis Hasensprung geplant. Danach folgen die MAZEN 005, Murtenstrasse bis Moosgasse, MAZ001, Neuenburgstrasse, MAZ 006, Unterdorf und Teile von Neuenburgstrasse, sowie die MAZ 002, Mitteldorf.

Wenn es Sie interessiert, wie so ein Glasfaserkabel eingeblasen wird, dürfen Sie gerne bei den Bauarbeitern dieses einmal anschauen gehen. Ein Hinweis dazu ist, wenn ein gelber Kompressor bei einem offenen Schacht steht und dort gearbeitet wird. Die Mitarbeiter der Forma Arnold werden Ihnen gerne die Methode erklären.

Hier der gültige Ablaufplan der einzelnen MAZEN:

FTTH Bargaen, Roll Out-Plan

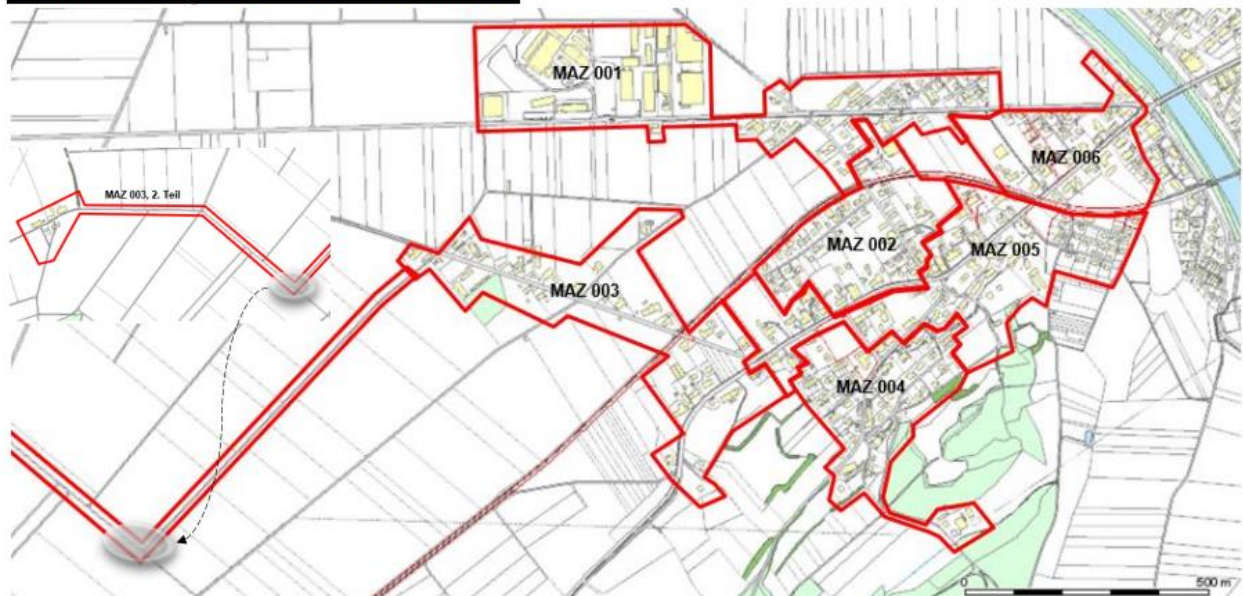

MAZ 003	Realisierung	Mai - Juli 2021	MAZ 001	Realisierung	August - September 2021
MAZ 004	Realisierung	Juni - September 2021	MAZ 006	Realisierung	September – Oktober 2021
MAZ 005	Realisierung	Juli - September 2021	MAZ 002	Realisierung	September – November 2021
			MAZ 003, 2. Teil	Realisierung	November - Dezember 2021
