



Info 3 über den Stand des Glasfaserprojekts

Die Gebäudeerschliessungsverträge sind zurückgegeben worden und 99 % der Eigentümerinnen und Eigentümer wollen einen Glasfaseranschluss. Das ist sehr erfreulich.

Wichtig – wie geht es nun weiter:

Ab jetzt gilt das neue Reglement und Preisblatt der Kommunikationsanlage Barga für zukünftige Erschliessungen von Gebäuden mit Glasfaser.


Wie im Infoschreiben bereits mitgeteilt, wird jedes Gebäude mit Glasfaser erschlossen. Also auch jene, welche keinen Anschluss wünschen. Dort wird nur ein technischer Hausanschluss realisiert, damit die Smart Meter Ablesung erfolgen kann. Für eine weitere Erschliessung, zum Beispiel mit OTO Dosen, gilt das neue Reglement.

Im Moment wird die Verbindung der Swisscom von ihren Strasseninstallationen in unseren POP Beunde erstellt.

Das beauftragte Ingenieurbüro erstellt nun die Detailplanung. Danach wird die Ausführung gemäss der MAZ-Planung in Angriff genommen. Für den Einbau der Glasfaserkabel ist die Firma Arnold AG beauftragt worden. Diese wird sowohl den Tiefbau, den Kabelzug und die Installationen in den Häusern durchführen. Vor Baubeginn werden auf einem Flugblatt, welches in alle Briefkasten der Gemeinde gelegt wird, die entsprechenden Personen vorgestellt. So ist sichergestellt, dass diesen Personen Vertrauen geschenkt werden kann. Vor jeder Hausinstallation wird der dazu beauftragte Unternehmer nochmals Kontakt mit den Eigentümerinnen und Eigentümern aufnehmen, damit die genaue Installation des Hausanschlusses und der OTO Dose vor Ort abgesprochen werden kann. Dabei wird auch aufgezeigt, wo eventuelle bauliche Massnahmen wie freilochen von überdeckten Schächten etc. nötig sind. Alle Grabarbeiten werden nach der Erschliessung wieder in den vorherigen Zustand zurück erstellt.

Hier nochmals der grobe Ablaufplan der einzelnen MAZEN:

FTTH Barga, Roll Out-Plan

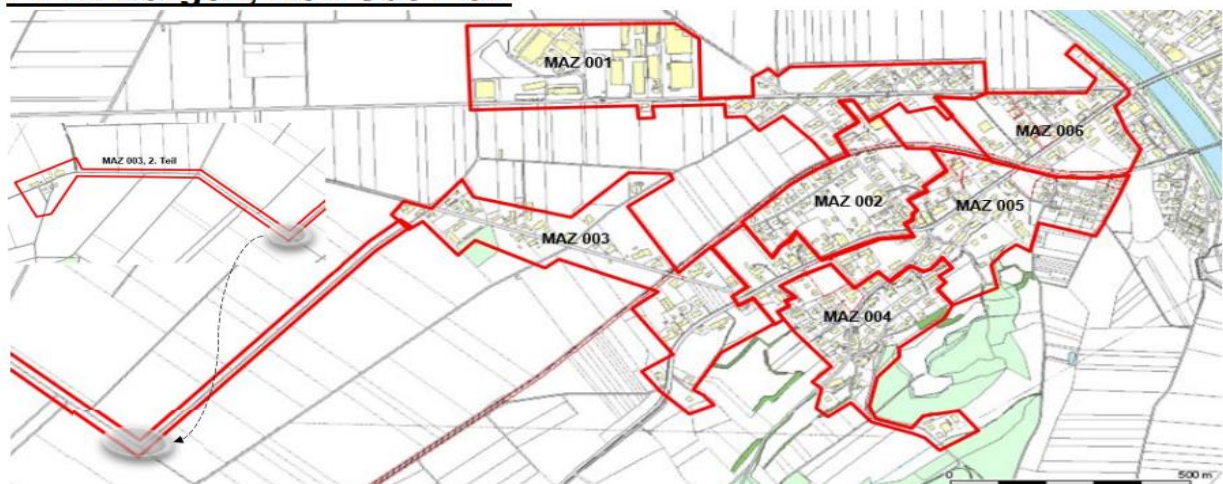

MAZ 003	Realisierung	April - Juni 2021
MAZ 004	Realisierung	Mai - August 2021
MAZ 005	Realisierung	Juni - September 2021

MAZ 001	Realisierung	August - September 2021
MAZ 006	Realisierung	September – Oktober 2021
MAZ 002	Realisierung	September – November 2021
MAZ 003, 2. Teil	Realisierung	November - Dezember 2021
